Houtlaan - reconstructie
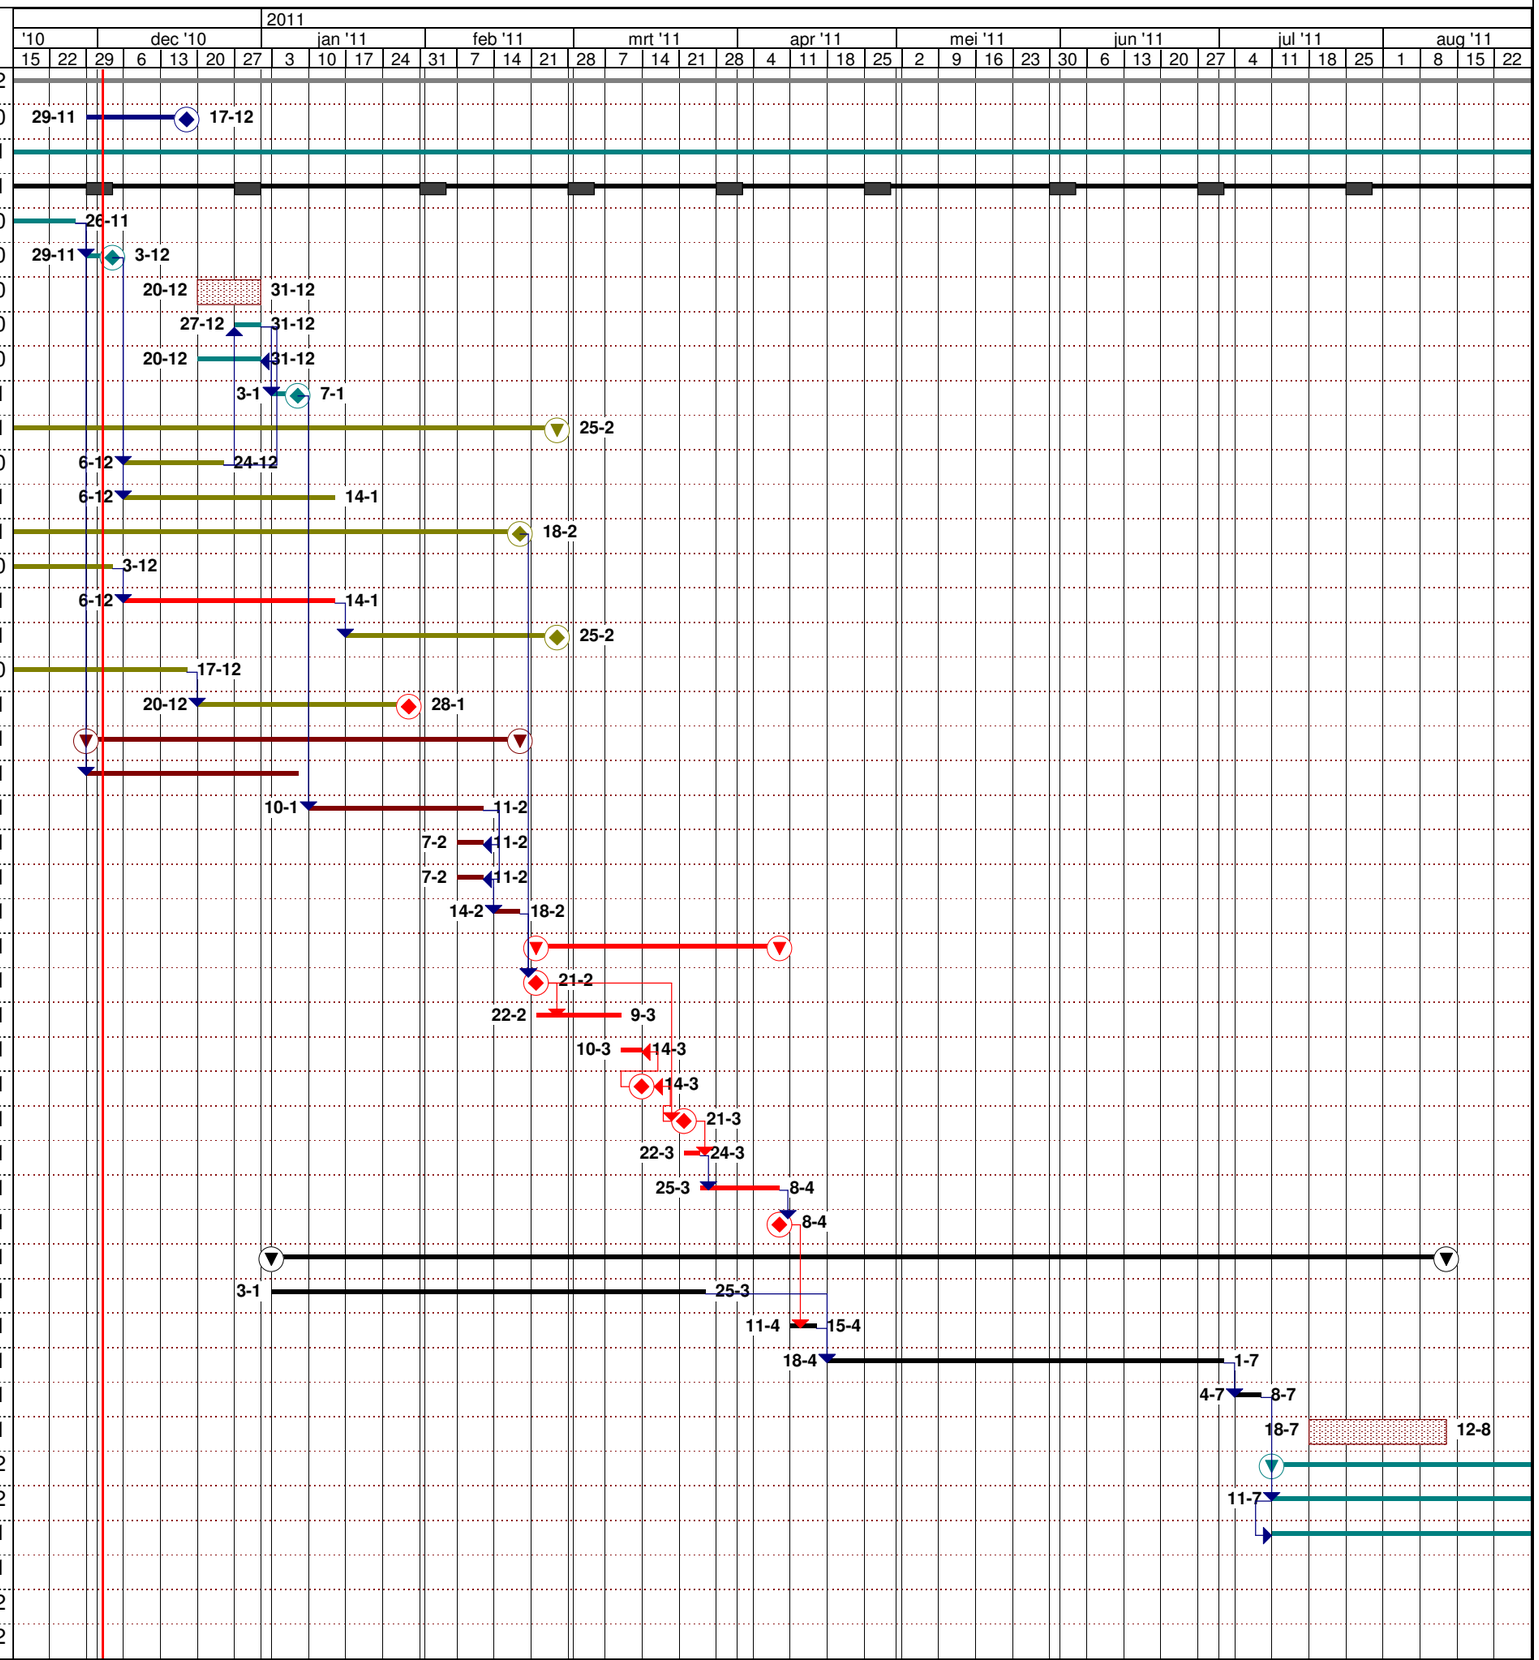
Id	Project omschrijving	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Houtlaan - reconstructie**	355 dgn	maa 30-8-10	vri 6-1-12
2	opstellen / aanleveren projectplan	3 wkn	maa 29-11-10	vri 17-12-10
3	***ontwerp fase***	265 dgn	maa 30-8-10	vri 2-9-11
4	communicatie - klankbordgroep	13 wkn	maa 30-8-10	vri 2-9-11
5	uitwerking VO naar DO	8 wkn	maa 4-10-10	vri 26-11-10
6	**afstemming opdrachtgever DO**	1 wk	maa 29-11-10	vri 3-12-10
7	Kerst - vakantie periode 2 weken	2 wkn	maa 20-12-10	vri 31-12-10
8	laatste aanpassingen DO	1 wk	maa 27-12-10	vri 31-12-10
9	raming DO	2 wkn	maa 20-12-10	vri 31-12-10
10	**def.akkoord opdrachtgever DO (gonogo DO)**	1 wk	maa 3-1-11	vri 7-1-11
11	***toetsing / vergunningen***	110 dgn	maa 27-9-10	vri 25-2-11
12	interne toetsing	3 wkn	maa 6-12-10	vri 24-12-10
13	***externe toetsing***	6 wkn	maa 6-12-10	vri 14-1-11
14	***aankoop gronden (of overeenkomst)***	16 wkn	maa 1-11-10	vri 18-2-11
15	verkeerscommissie	9 wkn	maa 4-10-10	vri 3-12-10
16	verkeersbesluit	6 wkn	maa 6-12-10	vri 14-1-11
17	***bezwaartermijn verkeersbesluit***	6 wkn	maa 17-1-11	vri 25-2-11
18	kapvergunning	12 wkn	maa 27-9-10	vri 17-12-10
19	***bezwaartermijn kapvergunning***	6 wkn	maa 20-12-10	vri 28-1-11
20	***bestek***	60 dgn	maa 29-11-10	vri 18-2-11
21	voorbereiding bestek	6 wkn	maa 29-11-10	vri 7-1-11
22	bestek	5 wkn	maa 10-1-11	vri 11-2-11
23	controle bestek	1 wk	maa 7-2-11	vri 11-2-11
24	begroting nav bestek	1 wk	maa 7-2-11	vri 11-2-11
25	laatste aanpassingen - definitief bestek / contract	1 wk	maa 14-2-11	vri 18-2-11
26	***aanbesteding en gunning***	34 dgn	maa 21-2-11	vri 8-4-11
27	plaatsen aankondiging	0 dgn	maa 21-2-11	maa 21-2-11
28	openbare inlichtingen	12 dgn	din 22-2-11	woe 9-3-11
29	nota inlichtingen maken	2 dgn	don 10-3-11	maa 14-3-11
30	nota inlichtingen plaatsen	0 dgn	maa 14-3-11	maa 14-3-11
31	aanbesteding	0 dgn	maa 21-3-11	maa 21-3-11
32	voornemen tot gunning	3 dgn	din 22-3-11	don 24-3-11
33	alcateltermijn	11 dgn	vri 25-3-11	vri 8-4-11
34	gunning	0 dgn	vri 8-4-11	vri 8-4-11
35	***uitvoering***	160 dgn	maa 3-1-11	vri 12-8-11
36	uitvoering kabels & leidingen	12 wkn	maa 3-1-11	vri 25-3-11
37	voorbereiding uitvoering	1 wk	maa 11-4-11	vri 15-4-11
38	uitvoering grijs & groen	11 wkn	maa 18-4-11	vri 1-7-11
39	oplevering	1 wk	maa 4-7-11	vri 8-7-11
40	Vierdaagse - bouwvakantie	4 wkn	maa 18-7-11	vri 12-8-11
41	***onderhoudstermijn***	130 dgn	maa 11-7-11	vri 6-1-12
42	onderhoudatermijn	26 wkn	maa 11-7-11	vri 6-1-12
43	voorbereiding overdrachtsdossier beheer	8 wkn	maa 11-7-11	vri 2-9-11
44	overdracht naar beheer	0 dgn	vri 2-9-11	vri 2-9-11
45	bankgarantie retour	1 wk	maa 2-1-12	vri 6-1-12
46	eindoplevering	2 wkn	maa 26-12-11	vri 6-1-12
